

J.0172172191L
(29)

SMLOUVA O DÍLO

Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně u kuchyně v budově B

Číslo smlouvy Objednatel: S484/21

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 607 008 383.

1.2 Zhotovitel:

Výtahy Line, s.r.o.

Blahoslavova 14/16, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice

IČ: 25174762, DIČ: CZ25174762

Bankovní spoj.: ČSOB, č.ú.: 912154483/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Placer – tel. 608 654 041

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kneifl - tel. 608 853 715

2 Předmět Díla

2.1 Předmětem Díla je závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „**Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně u kuchyně v budově B.**“.

2.2 Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání Díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně u kuchyně v budově B.**“
2. Nabídkou Zhotovitele vč. specifikace nabízeného výtahu a souvisejícího zařízení

2.4 Místem plnění je Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních – Úšovnicích, Tepelská 752, Mariánské Lázně, parcela p.č. 2250, k.ú. Úšovice

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se svou nabídkou, s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení Díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.6 Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:

- Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Vypracování dílenské projektové dokumentace
- Demontáž a ekologickou likvidaci původního výtahu
- Dodávka a montáž nového výtahu dle norem ČSN a EN
- Potřebná úprava šachty a dveřních otvorů pro montáž nových dveří
- Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Předání veškerých dokladů, zejména prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích dle příslušných norem ČSN a EN a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- Zajištění záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době
- Proškolení vybraných zaměstnanců Domova pro seniory pro obsluhu výtahu
- Odvoz, ekologická likvidace stávajících výtahů a souvisejícího zařízení a uložení ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využití k recyklaci.
- Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.7 Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

3 Cena Díla

3.1 Cena Díla (bez servisní činnosti) je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH

686 000,00 Kč

sazba DPH

21 %

výše DPH

144 060,00 Kč

cena celkem včetně DPH

830 060,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce Zhotovitele.

Cenová nabídka Zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení Díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení Díla;
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení Díla;
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Díla;
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele;
- veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení Díla;
- denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení Díla nezbytných k provedení Díla;
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení Díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací;
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění Díla;
- veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením Díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení Díla;
- veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména prováděcí dokumentace a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;
- veškeré náklady na pojištění, které je Zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu Díla;
- náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
- zisk Zhotovitele;
- Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací.
- Pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu Díla, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení Díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu Díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním Díla.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, Zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným Zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo Objednatelem přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje Zhotovitel.

4 Termíny plnění

4.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny do 180 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

4.2 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy budou dokončeny do 28.2.2022

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.3 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatel a jeho technickým dozorem.

5.4 Pokud se na Díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.6 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 92a odst. 2 zákona o DPH bez výše daně a na tento daňový doklad v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH uvede údaj, že „daň odvede zákazník“. Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

5.7 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je Objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad Zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej Objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu Zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) Objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu Objednatel dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání Díla v termínech dle bodu 4.1 a 4.2 smlouvy, popř. jiných sjednaných termínech, a to ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 3 000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu, a to 3.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku Zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu Objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího Zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedených v bodě 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 smlouvy), je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud Objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí Zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platného nařízení vlády.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za Dílo nebo jeho část.

7 Staveniště

7.1 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu zahájení prací na Díle dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění Díla, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené a bezvadné Dílo převzít.

8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.3 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický dozor.

8.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu Objednatel nevyplývá, že musí takový krok s Objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho

práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.6 Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na Objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním Díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny Objednatele.

8.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

8.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla.

8.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení pokud bylo vydáno. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda nebo nemajetková újma, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.12 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,
- zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,
- za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost Zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),

8.13 Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací Díla Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující Dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

8.14 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.15 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny Objednatelem. Změnu subdodavatele je Zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.

8.16 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou Zhotovitelem vypracovány změnové listy

číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Zdůvodnění navrhované změny“ a „Ocenění navrhované změny“ a budou sloužit pro Objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

8.17 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem – Objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje Zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství Zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.18 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu Díla. Do dosažení dohody o potřebné změně Díla je Zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit za předpokladů, že tak Objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8.19 Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení Díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v bodě 8.18, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část Díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

8.20 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení Díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením Díla souvisejících, a to za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení Díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá Zhotovitel Objednateli.

10 Zkoušky

10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se Zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

10.2 Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného Díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a další zainteresované strany

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného Díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení Zhotovitel sám.

11 Stavební deník

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti Zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je Zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace Díla vzniknou.

11.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO Zhotovitele,
- název, sídlo, IČO Objednatele,
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o Dílo.

12 Předání a převzetí Díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného Díla Objednateli v místě plnění. Po dokončení Díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla se rozumí:

- provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí Díla musí předcházet:

- provedení zkušebního provozu, pokud jej Objednatel požaduje,

- technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly Díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí Díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané Dílo“). V případě, že je předávané Dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

12.6 K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy ve 2 vyhotoveních včetně,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- provozní řády,
- zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho partnery,
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla,
- seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného Díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
- úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- stavební a montážní deníky,
- doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
- další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání Díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud:

- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval,
- Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané Dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného Díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného Díla,
- zhodnocení kvality předávaného Díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen Zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud Objednatel odmítl převzít předávané Dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané Dílo Objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které Objednatel předávané Dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že Objednatel předávané Dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že Objednatel oprávněně nepřevzal předávané Dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným Objednatelům školení ohledně provozu a údržby Díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí Díla Objednatelům, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy Objednatel určí své pracovníky ke školení.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného Díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení Díla nese Zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na Objednatel předáním a převzetím Díla.

14 Záruky

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 12.10 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany Zhotovitele záruka za vady a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u Zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatel z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude Objednatel uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené Objednatel v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod Zhotovitele a Objednatel o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě Zhotovitel písemně předá Objednateli.

14.6 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému Zhotoviteli vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc

15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních dnů,
- prodlení Objednatelů s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,
- jestliže předmět Díla či jeho část předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno Objednatelům Dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno,
- jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy,
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.13 této smlouvy,
- jestliže bude Zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele na základě návrhu věřitele Zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro Zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude Zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
- vstup Zhotovitele do likvidace,

- uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části Zhotovitelem, na základě které Zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy a podobně), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se tak také považuje zejména skutečnost, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání předchozího odstavce smlouvy, a k němuž došlo při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení

18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.4 smlouvy.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností Objednatele např. vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud Objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy Objednatel.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně 15 -10- 2021

České Budějovice, dne 8.10.2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
Starosta



.....
Martin Placer
jednatel

VÝTAHY
LINE S. r. o.
(9)
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Nabídka zhotovitele vč. specifikace nabízených výtahů (příloha č.1)

CENOVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI VÝTAHŮ č. 913421
Akce: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
v Mariánských Lázních – Úšovicích, Tepelská 752

V zastoupení –

VÝTAHY
LINE s.r.o.

**MODERNÍ
SPOLEHLIVÉ
BEZPEČNÉ**

to vše jsou
Výtahy LINE

- servis NON-STOP 24 hodin
- modernizace výtahů
- prosklené šachty a výtahy
- plošiny pro imobilní občany

výměny starých výtahů

Výtahy Line s.r.o. | Blahoslavova 14 / 16 | 370 04 České Budějovice
servis.vytahy@post.cz +420 608 853 715

www.vytahy-line.cz

**REFERENCE - za rok postavíme
v jihočeském kraji 90 až 100 výtahů.**



Věškeré servisní činnosti jsou prováděny speciálně k tomu vyškoleným personálem (27 techniků). Odborná znalost a dovednosti, jsou zárukou vysokého standardu kvality servisu.

Garantujeme dostupnost originálních náhradních dílů po dobu 10 let a po dobu 30 let jejich náhradu.

Vážení obchodní přátelé,

nabízíme Vám modernizaci Vašich výtahů v bytovém domě.

Zároveň nový pohon s frekvenčním měničem zajistí klidný průběh jízdy a velice přesné zastavení. Životnost výtahu se při odpovídajícím servisu kalkuluje na 30 let. **V konstrukci řízení výtahu nejsou použity blokuující prvky hardwarové nebo softwarové.** Zároveň Vám zaručujeme kvalitní a včasnou servisní péči. Naše firma v současné době zabezpečuje servis v počtu více než 1.600 výtahů a územně pokrýváme oblast České Budějovice – Plzeň – Praha – Pelhřimov.

PARAMETRY VÝTAHU:

	Výchozí stav	Stav po modernizaci
Typ výtahu		min TOV 550
Jmenovitá nosnost		min 550 kg
Jmenovitá rychlost		min 0,52 m/s
Výtahová šachta		zděná
Rozměr šachty (š. x hl.)		
Počet stanic/nástupišť	2/2	2/2
Kabina	neprůchozí	neprůchozí
Rozměr kabiny (plocha)		až 1100 š x 1700 h x 2100
Kabinové dveře		automat. BUS 900-1000
Šachetní dveře	žádné	900-1000x2000
Vodítka protiváhy		pevné, ocelový profil T50
Řízení výtahu		mikroprocesorové
Výtahový stroj		



úsporné osvětlení LED

Výťahové stroje používané naší společností splňují veškerá kritéria zaručující vysokou kvalitu a dlouhou životnost



TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT:

ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový
- hlavní vypínač výtahu
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

RÁM KLECE

- ocelový složený z hlavy klece, pevné podlahy a spojovacích nosníků
- použitý materiál ocelové a plechové profily
- povrchová úprava – Komaxit
- certifikované obousměrné zachycovače typ PR 2000 UD

KABINA VÝTAHU

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava interiéru – Plalam.....
- osvětlení kabiny – LED pásky
- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)
- zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong
- zrcadlo, madlo
- GSM brána pro komunikaci s vyprošťovací službou 24 hod.
- pevná podlaha – protismyková podlahovina (odstín č.....)
- větrací mřížky

TLAČÍTKA V KABINĚ

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlená tlačítka s potvrzením volby :

- tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy
- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm
- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- **automatické typ BUS 900-1000 x 2000 mm**
- povrchová úprava – NEREZ

ÚPRAVA PROTIVÁHY A MONTÁŽ PEVNÝCH VODÍTEK

- **montáž nových vodítek protiváhy**
- **montáž nových vodítek kabiny**
- nové konzole ukotvené do ohrazení šachty

- nová protiváha
- OMEZOVAČ RYCHLOSTI
- umožňující oboustranné vybavení
 - kalibrován na jmenovitou rychlost
 - lanko 6,3 mm

ŠACHETNÍ DVEŘE

- **2 ks ruční jednokřídlé 900 – 1000 x 2000 mm**
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – Komaxit (odstín č. 7032)

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje :

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- **polohová signalizace (display) ve všech stanicích**
- směrová signalizace – směrové šipky ve všech stanicích
- přivolávač do stanice

VÝTAHOVÝ STROJ

Nový výtahový stroj odpovídající nosnosti min 550 kg.

NOSNÉ ORGÁNY

kvalitní ocelová lana (německý výrobce)

NOUZOVÉ SPOJENÍ KABINY

- použití GSM brány – **včetně vzdáleného dohledu**

ECO DRIVE A DLE VDI 4707

1. NABÍDKOVÁ CENA REKONSTRUKCE VÝTAHU VČETNĚ SERVISU NA 60 M

Cena rekonstrukce 1 ks výtahu bez DPH	752.000,- Kč
DPH 21 %	157.920,- Kč
Celková cena včetně DPH za 1 ks	909.920,- Kč

Cena obsahuje:

- demontáž stávajícího výtahu
- montáž nového výtahu
- technická dokumentace
- zkoušky a všechny potřebné certifikáty
- ekologická likvidace obalů a demontovaných částí výtahu
- průběžný a závěrečný úklid
- předání a zaškolení

TERMÍN REALIZACE

1) dle SOD

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Zhotovitel poskytne objednateli **záruku** na předaný a do provozu uvedený výtah po dobu **60 měsíců**, za předpokladu řádně prováděného servisu.

SERVIS ZAŘÍZENÍ – provádíme záruční i pozáruční servis.

Čtvrtletní komplexní paušální cena 3.300,- Kč bez DPH (jeden výtah)
(revize, mazání, čištění, preventivní údržba).

Na přání zákazníka – vzdálený dohled výtahu On-line informační systém - 190,- Kč bez DPH (měsíčně).

PLATEBNÍ PODMÍNKY

úhrada v průběhu modernizace (splatnost faktur 21 dní)

30% ceny = 1. dílčí faktura po podpisu smlouvy

50% ceny = 2. dílčí faktura po zahájení montáže výtahů

20% ceny = 3. konečná faktura po předání a uvedení výtahů do provozu

PLATNOST NABÍDKY - DO 30. 09. 2021

POZNÁMKA

Námi nabízené výtahy jsou v souladu s **EN 81-20 a EN 81-50** a řeší rizika vyplývající z provozu výtahu.

Děkujeme za poptávku a po domluvě Vás navštívíme na Vaší adrese k dalšímu technickému a popřípadě obchodnímu upřesnění. Můžete nás samozřejmě také navštívit na adrese naší firmy.

Doplňkové služby:

Veškeré práce pro Váš dům: natěračské, zednické, obkladačské, zámečnické, elektrikářské.

Pro Váš dům můžeme zajistit i kamerový systém.

V Českých Budějovicích 10. 08. 2021

Nabídku vypracoval :

Nabídku schválil :

VÝTAHY
LINE s. r. o.
(13)
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

.....
Ing. Petr Kneifl – obchodní technik
608 853 715

.....
Martin Placer – jednatel

Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 05 České Budějovice,
POBOČKA PLZEŇ, SKLADOVÁ 24
IČO: 25174762, DIČ: CZ25174762, e-mail: petr.kneifl@vytahy-line.cz
tel.: 608 853 715

Technická specifikace

dle skutečného zaměření odsouhlasení investorem

PARAMETRY:

Typ výtahu

Jmenovitá nosnost

Jmenovitá rychlost

Výtahová šachta

Rozměr šachty (š. x hl.)

Počet stanic/nástupišť

Kabina

Rozměr kabiny (plocha)

Kabinové dveře

Šachetní dveře

Řízení výtahu

Výtahový stroj

Stav po modernizaci

LC Mini 500

500 kg**0,15 m/s**

zděná

1800 x 1800

2/2

neprůchozí

1100 š x 1650 h x 2100**fotozávora****ruční 2 křídle 2x 500x2000**

mikroprocesorové

TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT:**ELEKTROINSTALACE**

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový
- hlavní vypínač výtahu
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

RÁM KLECE

- ocelový složený z hlavy klece, pevné podlahy a spojovacích nosníků
- použitý materiál ocelové a plechové profily
- povrchová úprava – Komaxit
- certifikované obousměrné zachycovače typ PR 2000 UD

KABINA

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava interiéru – Plalam DT 66 boky, záda DT 67
- osvětlení kabiny – LED pásy
- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)
- zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong
- GSM brána pro komunikaci s vyprošťovací službou 24 hod.
- pevná podlaha – protismyková podlahovina (plech)
- větrací mřížky

TLAČÍTKA V KABINĚ

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlená tlačítka s potvrzením volby :

- tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy

- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm
- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- **fotozávora**

ŠACHETNÍ DVEŘE

- **2 ks ruční dvoukřídle 2 x 500 x 2000 mm**
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – Komaxit (odstín č. 7032)

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje :

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- **polohová signalizace (display) ve všech stanicích**
- směrová signalizace – směrové šipky ve všech stanicích
- přivolávač do stanice

NOUZOVÉ SPOJENÍ KABINY

- použití GSM brány

ECO DRIVE

V Českých Budějovicích 30. 09. 2021

VÝTAHY
LINE S. r. o.
 (13)
 Blahoslavova 16
 České Budějovice
 370 04

.....
 Martin Placer – jednatel


Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 05 České Budějovice,
 POBOČKA PLZEŇ, SKLADOVÁ 24
 IČO: 25174762, DIČ: CZ25174762, e-mail: petr.kneifl@vytahy-line.cz
 tel.: 608 853 715

Řez šachtou

ŘEZ ŠACHTOU

RÁM: RHN-EC

M1:20

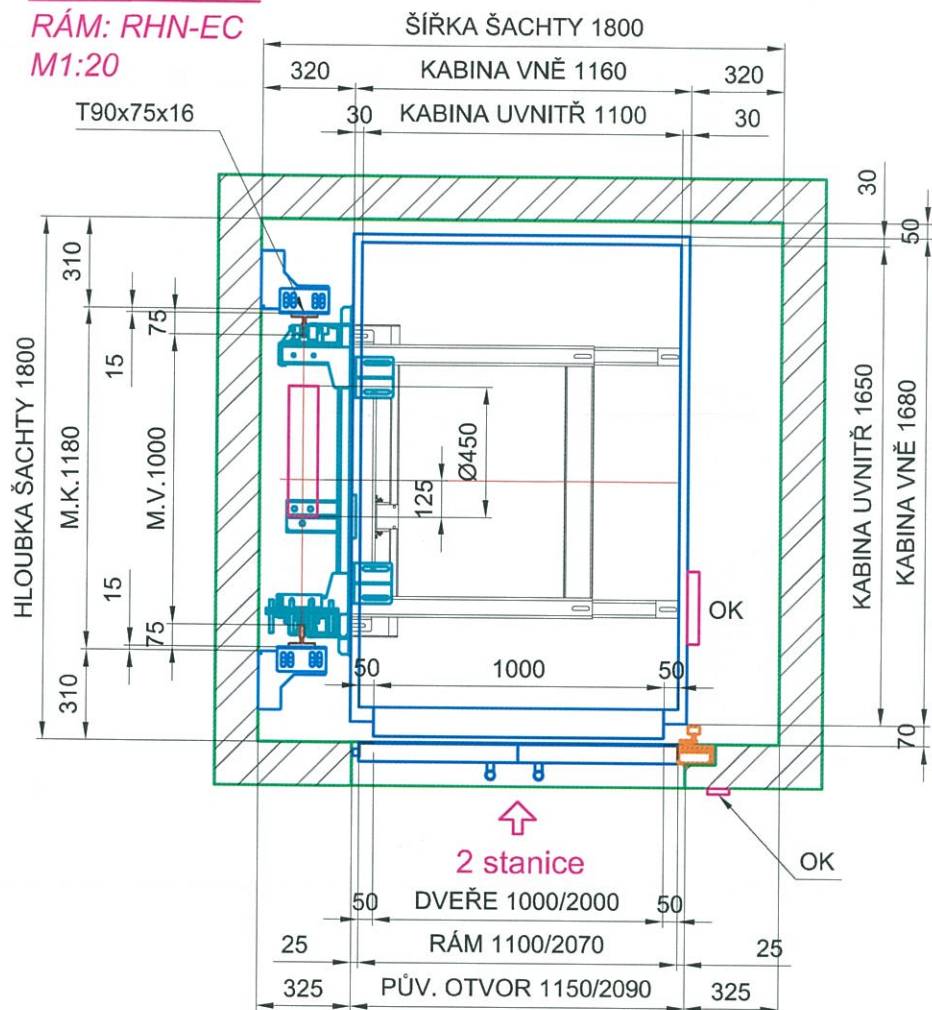


DVEŘNÍ OTVOR

ŠACHETNÍ:

BRUMOVICE EMAN 93

KABINOVÉ: FOTOZÁVORA

M1:20

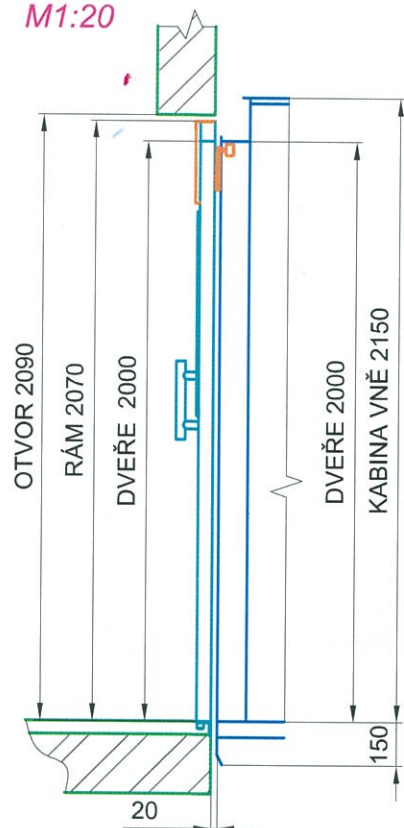

Změna	Číslo	Datum	Popis změny
	1		
	2		
	3		

Zákazník		VÝTAHY LINE s.r.o.		Opatření pro omezený prostor v šachtě dle 81-21:
Číslo zakázky		Hlava šachty	3 400 mm	
Reference	DPS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Zdvih	3 200 mm	
Typ výtahu	LCmini 500 industry	Prohlubeň	750 mm	
Vypracoval(a)	Ing.Chlebus L.	Podpis		
Schválil	Ing.Chlebus L.			
Datum	24.9.2021	Datum		

Poznámka: Tento "řez šachtou" je nedílnou součástí kupní smlouvy kompletního výtahu. Kupující svým podpisem kupní smlouvy stvrzuje správnost údajů obsažených ve výkrese "řez šachtou", zejména se jedná o rozměr šachty, pozice a druh dveří včetně rozměru dveřního otvoru a kabiny. Na pozdější požadavky na změny rozměrů nemůže být brán zřetel.

Tento řez šachtou ruší všechny předešlé řezy šachtou se stejným číslem a starším datem.
